ABONY SÍVÓ KÚRIA MŰSZAKI ÜTEMTERV

ono	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
1				
2	Felvonulás	5 nap?	Hét 24.05.27.	Pén 24.05.31.
3	Bontási munkák	15 nap?	Hét 24.06.03.	Pén 24.06.21.
4	Csempe burkolat bontása	10 nap?	Hét 24.06.03.	Pén 24.06.14.
5	Padlólap bontása	10 nap?	Hét 24.06.10.	Pén 24.06.21.
6	Padló rétegrend bontása	10 nap?	Hét 24.06.17.	Pén 24.06.28.
7	Vakolatok leverése	5 nap?	Hét 24.06.24.	Pén 24.06.28.
8	Falátvágás, utólagos falszigetelés	5 nap?	Hét 24.07.01.	Pén 24.07.05.
9	Padló rétegrend építése	9 nap?	Hét 24.07.08.	Csü 24.07.18.
10	Padló fűtés szerelése	9 nap?	Pén 24.07.19.	Sze 24.07.31.
11	Aljzatbetonozás	9 nap?	Hét 24.07.29.	Csü 24.08.08.
12	Egyoldali gk. falak	5 nap?	Hét 24.08.12.	Pén 24.08.16.
13	Elektromos alapszerelés	10 nap?	Hét 24.08.12.	Pén 24.08.23.
14	Gépész alapszerelés	10 nap?	Hét 24.08.12.	Pén 24.08.23.
15	Vakolás	10 nap?	Hét 24.08.19.	Pén 24.08.30.
16	Gk. falak zárása+álmennyezet	11 nap?	Pén 24.08.30.	Pén 24.09.13.
17	Beltréi nyílászáró beépítése	6 nap?	Hét 24.09.16.	Szo 24.09.21.
18	Hidegburkolás	14 nap?	Hét 24.09.23.	Csü 24.10.10.
19	Lakatos szerk.	5 nap?	Hét 24.10.07.	Pén 24.10.11.
20	Glettelés, festés	35 nap?	Hét 24.09.30.	Pén 24.11.15.
21	Elektromos, gépész szerelvényezés	11 nap?	Pén 24.11.15.	Pén 24.11.29.
22	Gumipadló burkolat készítése	5 nap?	Hét 24.11.25.	Pén 24.11.29.
23	Bútorok, szekrények	5 nap?	Hét 24.12.02.	Pén 24.12.06.
24	Tető héjazat csere	20 nap?	Hét 24.10.07.	Pén 24.11.01.
25	Bádogozás	10 nap?	Hét 24.10.21.	Pén 24.11.01.
26	Elektromos betáp kábel fektetése	15 nap?	Hét 24.10.14.	Pén 24.11.01.
27	Kertépítési munkák	14 nap?	Hét 24.11.04.	Csü 24.11.21.
28	Épület körüli térburkolat kész.	10 nap?	Hét 24.11.11.	Pén 24.11.22.
29	Takarítás	7 nap?	Hét 24.11.25.	Ked 24.12.03.
30	Műszaki átadás-átvétel	3 nap?	Sze 24.12.04.	Pén 24.12.06.

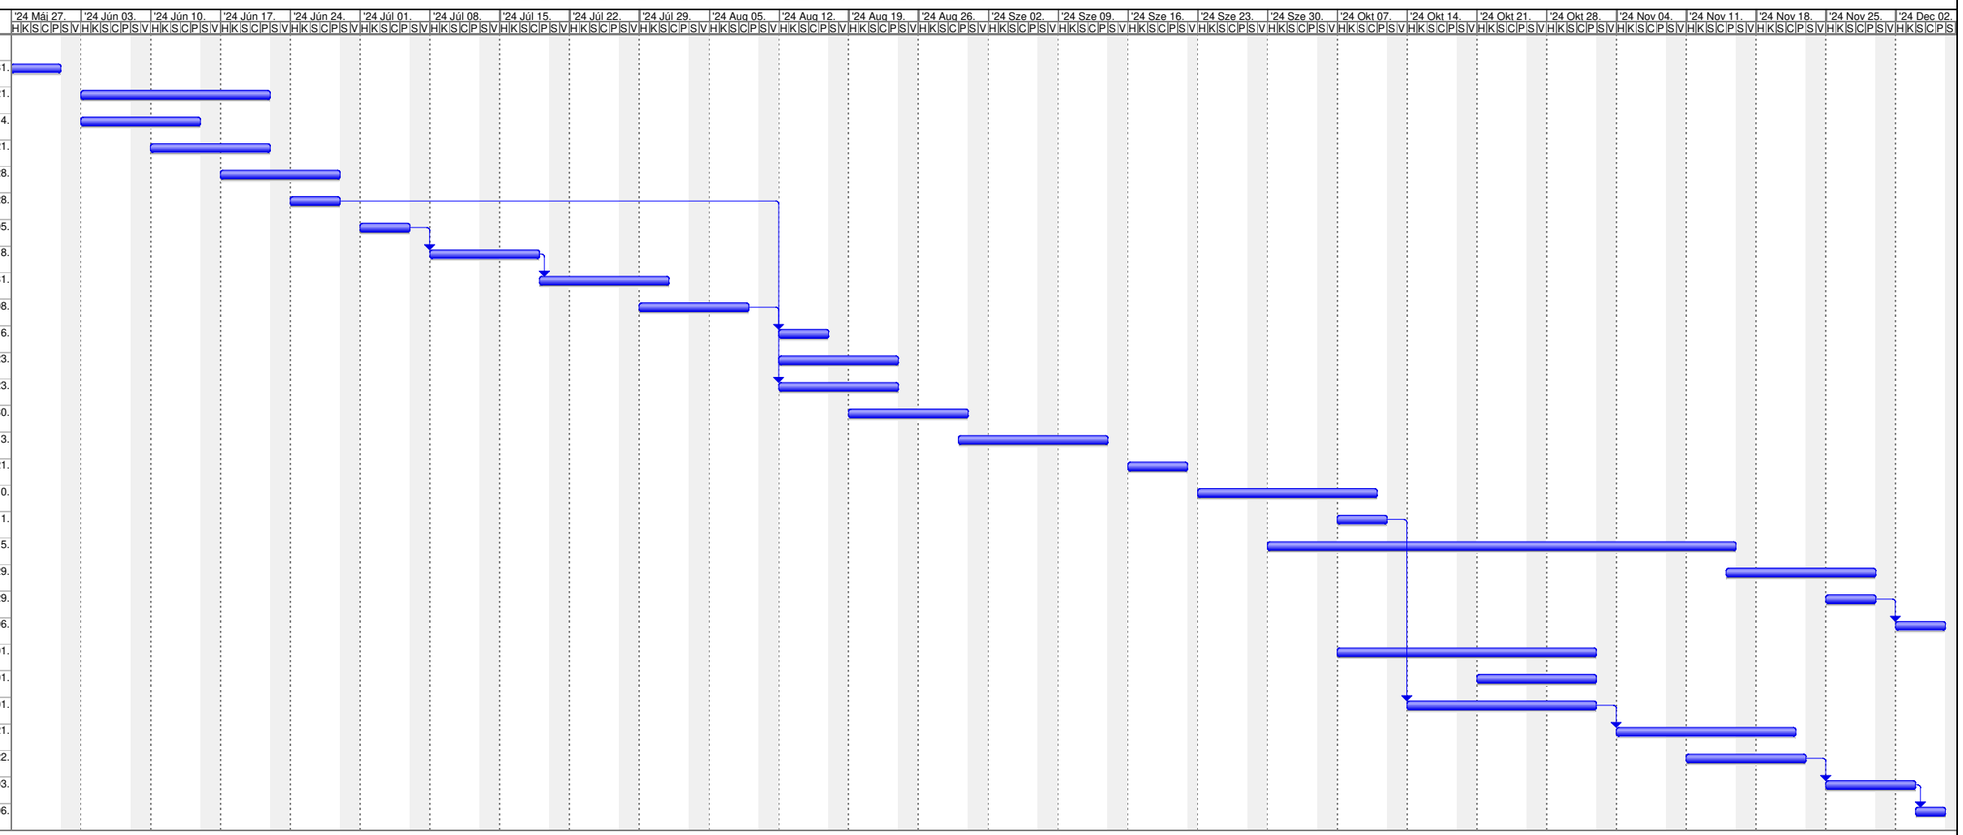

Projekt: Ütemterv240521
Dátum: Ked 24.05.21.

Tevékenység | Megszakítás | Végrehajtás | Mérföldkő | Összefoglalás | Projekt összefoglalása | Külső tevékenységek | Külső mérföldkő | Határidő
